Линеен календарен график за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин — у Георги Бондоков", улица "Гоце Делчев", улица "Станко Маринцестов", улица "Лев Толстой", ул. "Димитър Зограф", улица "Борис Попарданов", улица "Иван Вазов", улица "Христо Смирненски", улица "7-ми Ноември" и улица "Дунав"


За Обособена позиция № 1: "Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. "Станко Маринцестов", ул. "Лев Толстой", ул. "Борис Попа Вазов", ул. "Климент Охридски", ул. "Христо Смирненски", ул. "7-ми ноември"

Етапи и поетапи на изпълнение, видове дейности и СМР	трудоемкост за съответната дейност	звеко дни)	работници		календарни дни	ксперти, отговорни за изпълнението	необходима строителна техника							м	есец	търв	н															Mec	ец вт	гори															
	труд	no cnei		omgo	кале	експерти, за изпъ	нео			1-10					11.30						21-30			T			31-40			T			41-50			1			9	9			Ī		- Allering	61-70			
Етап 1 - подготвителен																		П							П		I	T			T					Ť				T		T	T	T	T	T	T	\prod	1
йност 1- Подписване на этокол обр. 2а за :риване на строителна эщадка					1	Технически ръководител																																											
йност 2- Организация на юителната площадка; менно строителство; билизация на строителна ханизация	20	общ работник - 4		4	5	технически ръководител; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Товарен автомобил - 2	4	 4 4																																								
тап 2 - Основен гап - изпълнение на СМР	-																																			1										Ħ			1
Тодетал 2.1. СМР на "Реконструкция и рехабилитация на ул."Иван Вазов"																																															1		1
Почистване на уличното глатно за строителство, лючително натоварване и превоз на депо; Изкоп чалодзваем материал, вил. превоз на депо до Зми	36	общ работник - 3		3	12	Технически ръководител; Геодевист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за нздухване на асфалт - 1			3 3	3 9	3	3 3	3 3	3 7	3																																	The second secon
Фрезоване на съществуващата фактобетонова настилка включително, транспортиране на дело					6	Технически ръководител; Геодезист; Слециалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни Условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издукване на асфалт - 1											INDIVICACION OF DESIGNATION OF																															
Доставка и полагане на гонови бордиори 18/35/50 сл. всички свързин с това разходи	9	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1		3	3	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по Здравословии и безопасни условия на труд	Товарен ввтомобил - 1, Самосвал - 1									3	3	3																															
Битумен разлив	135	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	4	15	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословин и безопасни условия на труд.	Гудронатор - 1											3	3 3	3 3	3	3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	The state of the s	3 3	3 3	3 :	3 3	9 3	3	3 3	3	3 3	3	3 3	3	3 3	3 2	3. 3	3 3	3				
Доставка и полагане на нелиътен асфалтобетон индер/ за къравингелен пласт	63	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	2	1	Технически ръколодител; Геодезист; Слециалист по контрол на мачеството; Слециалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплача - 1												3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3 :	3	3 3	3 3	3	3 3	8 8																		
Доставка и полагане на залтова смес за измосващ «т – Пълътен асфалтобетон тип"А"	72	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	24	1	Текнически ръноводител; съдезист; Специалист по на качеството; Специалист по дравословни и безопасни условия на Труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																								3 3	3	3 7	3	3	3 1	3	3 1	3.	3 3	3	a 3	3	3 3	3 3	3			
Доставиа и монтаж на внаартин, рефлектиращи ътни знаци, клас-1, II-ри поразмер; Укрепавне на внаартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м	2	работник пътно строителство - 1	1	2	Технически пъководител:	телентически римоводител; Геодезист; Специалист по контрол на мачеството; Специалист по здравословни и безопасни Условия на труд	Автомобил товарен - 1																																	9						The second second	3		-
Поставка и полагане на изонтална маркировна от бяла боя с перли	3	работник пътно строителство - 1	1	3		Геодавист, Специанисто конгрол на качествого; Специалист по здваословни и базопасни Условия на труд	маркировъчна машина - 1																																								1	1	1


,	ги														-		 		M	ecei	, чет	пър	ти	_	_		_	_	_	_		T			_					-		wec	ецп	ети				_	-	-			7		-			_	_	-									_			_		_
						81.90			_	1				91.100	201		1	200	_		101-110	-					-	111-120			_	+			-	121-130	_	_	7				131-140		_					141-150							151-160	_			Γ		we	Сец		сти		Т				08		_
	4	\prod				I				I	I	I			I	I	1	I			I		T		T	T		Ī	T			t		1	T		T			T	П	T	=	T	Τ	П	T	T	П	141	П	T		T	П	Τ	į N	П	Τ	П	H	T	П	181-17	T	Т	П	+	Т	П	Т	171-180	7	Т
																																I							1			1		1					+		\parallel	1	\parallel	1	+	\dagger		+	+	H	+	+	H		+	+	H	+	+	H	+	1	1	H
1	T				1				1	T				1	1		t		1	+	H	1	1	+	\dagger		+	1		-	1		1	1	-	1	-		+	$\frac{1}{1}$	+	+	H	+	H	H	+	$\ $	+	\parallel	+	\parallel	4	H	4	-	H	+	H		1	-	$\ $	4	-			1	Ц			-		\coprod
																																																																								The second secon		
																																				T				1			1		1	1		1		1				H	-	+	\dagger		+	+		-	+	+	H	+	+		+	-	H		-	H
																		1			1		1	I		1			1			1	\dagger				1	+		1		+	1		1	1		+		+	\parallel	1	$\ $	+	H	+	+		+	+	H	+	+	\parallel	H	+	+	\parallel	+	\parallel	+	-	-	\parallel
	\parallel	H	+	1	\parallel	+		H	1	+	+	+	-		+	+	+	+	H	+	-		+		+	+	H	1	+	H	4	1	H	4	+	H	1		\parallel	1		1		1	-		4				Ц		Ц																					
																							TO SECURE AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERS																																																			
																																	+																																									
					Allino																																				1																															The state of the s		



Подетап 2.2 СМР н "Реконструхция и рехабилитация на у. "Климент Охридски	1.																													T												
Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване превоз на депо, Иэкоп неизползваем материал, в превоз на депо до Зкм	е и кл.	9	общ работник - 3		3	м Технически ръководител; Геодезист, Специалист по	контрол на качеството; Специалист по Здравословни и безопасни	условия на труд Самосвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1									3 3	3																								
Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилк: включително, транспортиране на депо						ь Технически ръководител; Геодозист, Специалист по	лон прол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																																		
Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/5 вил. всички свързии с това разходи		3	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1		3	ехнически ръководител; еодезист; Специалист по контрол на качеството;	Специалист по здравословни и безопасни условия на	труд Говарен автомобил - 1, Самосвал - 1										3																								
Битумен разлив	36	6	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1		3	Текнически ръкаводител; Г Специалист по контрол на	качеството; специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Гудронатор - 1											3 3	3 3	T	3 3	3 3	3)	, de																	
Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (21		общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	3	оводител; циалист по	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплочв - 1											3		3 3	3	3																			
Доставка и полагане на всфантова смес за износващ иласт – Плътен асфантобетон тип"А"	15		общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	5	ководител; циалист по	ZZ	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча -															3.	3	3 3																	
Доставка и монтаж на тандартни, рефлектираци тотни знаци, клас-1, II-ри типоразмер: Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м	1		работник пътно строителство - 1	1	1	Технически Геодезист; Контрол на	здравословни и безопасни условия на труд	Автомобил товарен - 1																		1																
Деставка и полагане на ризонтална маркировка от бяла боя с перли	1		работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист со	здравословни и безопасни условия на труд	маркировъчна машина - 1																		DESCRIPTION OF THE PERSON																
Подетап 2.3. СМР на "Реконструкция и Рехабилитация на ул. Христо Схирненски"																								T		83															+	
Почистване на уличното платно за строителство, почително натоварване и превоз на деле; Изкоп зползваем материал, вкл. превоз на дело до Зкм	60		общ работник - 3	3	20	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по Койтрол на качеството;	безопаски условия на труд	Самссвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1		3 3	3	3	3 3		3 3	3 3	3 :	3	3.3	3																						
монтаж на съществуващи дчори, вкл. превоз на депо	12	c mnavyes illyo	опщ расотник - 3	3	4	Технически ръководител; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд	латомоомл товарен - 1.						3.3	3 3																											
оставка и полагане на нови бордкъри 18/35/50 всично съвърани с това разходи	51	общ работник - 2; работник	пътно строителство - 1	3	17	Texhrivecki pekoboditen; Feodesher; Chellianher no Kohrpon Ha kavectaoro; Chellianher no	условия на труд Условия на труд	Товарин автомобил - 1 , Самосвал - 1												3	3	3 3	3 3	3 :	3 3	3, 3	3	3 3	3 7													
права насип от скален териал на пластове за пътна основа, вкл. стилане и уплътняване	56	общработник - 2; работник	nother or powrences o . 2	1 2	14	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безоласни		Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																						4	4	SCHOOL SC	4	4 4	4	4 4	4					

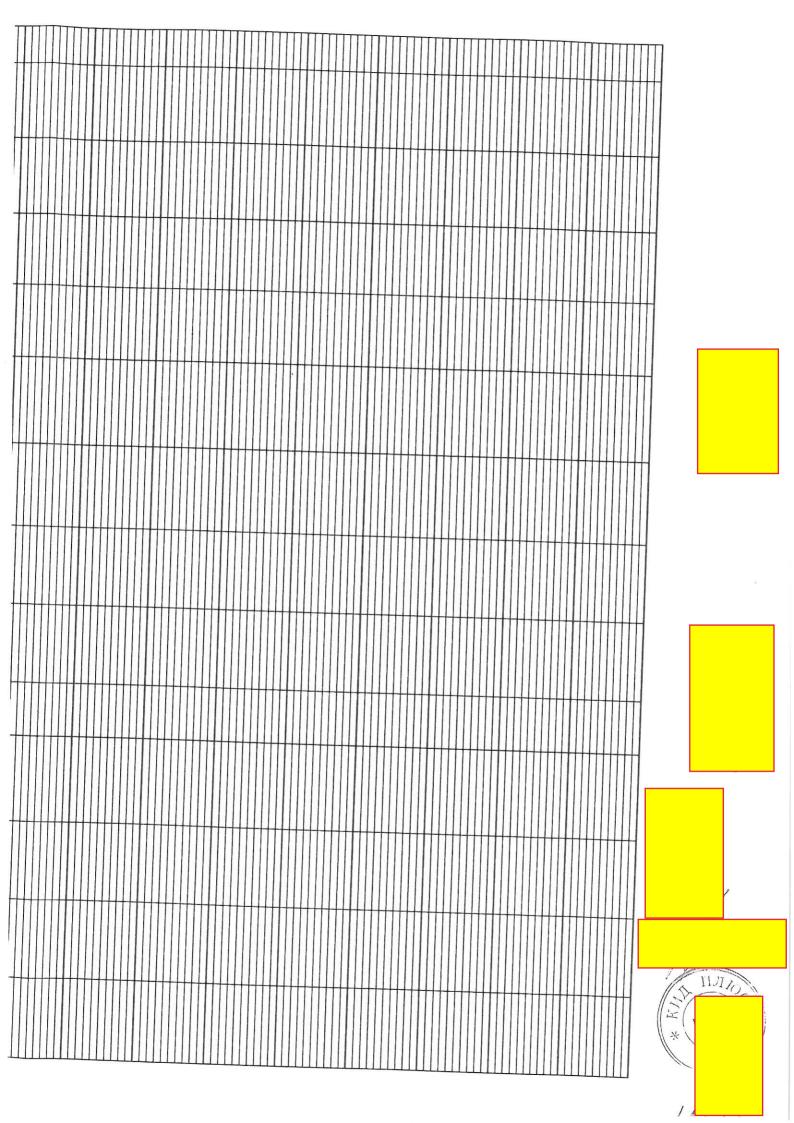


вка и полагане на гиран трошен камък	15	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	5	Техинчески ръководител; Специалист по контрол на Качеството; Специалист по здравосилени и безопасни	условия на труд	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброглоча - 1																		3 3	3	3 3							
пумен разлив	42	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	14	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопаени	условия на труд	Гудронатор - 1																	3	3 3	3	3 3	3 3	3	3 3	3	3 3		
вка и полагане на за смес за износващ лътен асфалтобетон тип [*] А"	21	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	7	Технически Геодезист; С контрол на Специалист по	безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброглоча - 1																						э	3)	3	3 3	The State of the S	
18ка и монтаж на тни, рефлектиращи наци, клас-1, II-ри мер; Укрепване на этни знаци, тръбни ки ф 60 L = 3.0 м	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на мачествого; Специалябст по	уславия на труд	Автомобил товарен - 1																											1
вка и полагане на гална маркировка от ла боя с перли	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по конгрол на качеството; Слециалист по	условия на труд	маркировъчна мвшина - 1					-																						
ап 2.4. СМР на юнструкция и илитация на ул leв Толстой							Σ																											
гване на уличното оза строителство, елно натоварване и из на депо; Изкоп ваем материал, вкл. из на депо до Зкм	6	общ работник - 3	3	2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по- контрол на качеството; Слещналист по	условия на труд Самосвал - 2 , Челен	товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1												Personal Principal Princip															
2резоване на ществуващата ъбетонова настилка ключително, портиране на депо				1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Стециалист по заравословни и безопасни	условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																											
вка и полагане на 4 бордюри 18/35/50 нки свързни с това разходи	3	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и	безопасни условия на труд	Товарен автомобил - 1, Самосвал - 1																											
пумен разлив	18	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	6	Технически ръководител; Специалист по контрол на (ачеството; Специалист по дравословни и безопасни	условия на труд	Гудронатор - 1																											
вка и полагане на ген афалтобетон з/ за изравнителен пласт	6	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	2	Технически ръководител; Геодевист; Специалист по контрол на качеството; Слециалист по здравословни и безопасни	условия на труд Самосвал - 2,	Асфалтополагач - 1; Баляк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброглоча - 1																											
зка и полагане на на смес за износващ льтен афалтобетон тип"А"	9	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	3	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд Самосвал - 2,	Асфалтополагач - 1, Баляк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																											
вка и монтаж на тни, рефлектиращи наци, клас-1, II-ри мер; Укрепване на лни знаци, тръбки ки ф 60 L = 3.0 м	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодозист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по дравословни и безопасни	условия на труд	Автомобил товарен - 1																											
зка и полагане на ална маркировка от ла боя с перли	1	работник пътно стронтелство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд	маркировъчна машина - 1																											

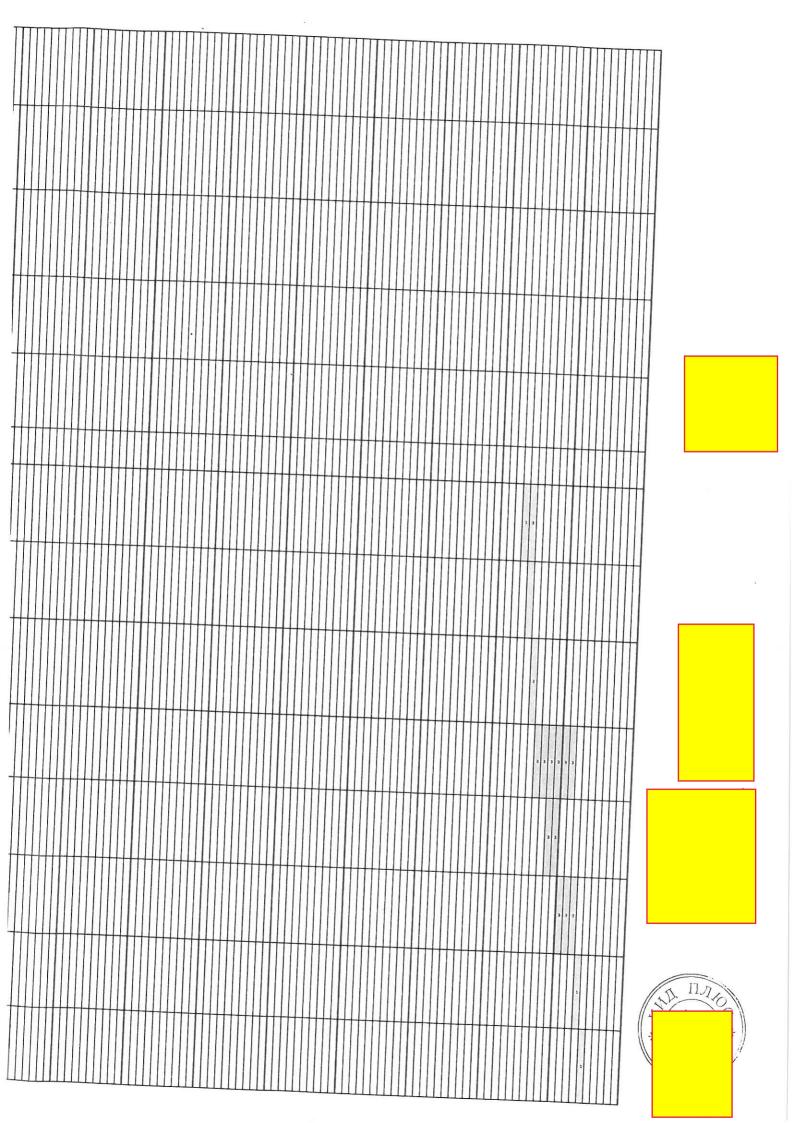


ал 2.5. СМР на сонструкция и илитация на ул. дми ноември								1									T			T															T					I	П		Γ
тване на уличното о за строителство, елно натоварване и зна депо; Изкоп ваем материал, вку за на депо до Зкои	30	общ работник - 3		3	10	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни	и резоласти условия на труд Самосвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																																				
эка и полагане на 1 бордюри 18/35/50 чки свързни с това разходи	27	общ работник - 2; работник пъно строителство - 1		3	9	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд Товарен автомобил - 1 , Самосвал - 1																																				
а насил от скален кал на пластове за на основа, вкл, ане и уплътняване	32	общ работник - 2; работник пътно строителство - 2		4	8	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1;	T - Promindous																																			
іка н полагане на иран трошен камък	9	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1			3	Гехнически ръководител; геодезист; Специалист по Контрол на качеството; Специалист по • Дравословни и безопасни	условия на труд мосвал - 2, Валяк статичен 1; Валяк вибрационен - 1; Виброглоча - 1																																				
гүмен разлив	21	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	,	,	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	Гудронатор - 1																																				
ка и полагане на) смес за износващ ътен асфалтобетон тип"А"	12	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	4		Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по кдравословни и безопасни условия на труд	Семосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																																				
жа и монтаж на ни, рефлектиращи изши, клас-1, II- ри нер; Укрепване на ни знаци, тръбни нф 60 L = 3.0 м.	1	работник пътмо строителство - 1	1	1	Textundentum mundones	технически рековордител; Геодезист, Слециалист по контрол на качеството; Специалист по Дравословни и безопасни Условия на тъхл	Автомобил товарен - 1																																				
га и полагане на пна маркировна ст 1 боя с перли	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически въководител:	Теодезист, Специалист по контрол на качествого; Специалист по здравослови и безопаски в труд условия на труд	маркировъчна машина - 1.																																				
л 2.6. СМР на нструкция и итация на ул. Попарданов																																											
зне на уличното а строителство, но натехварване н на депо; Изкоп ем материал, вкл. на депо до Зки	57	общ работник - 3	3	19	Технически ръководител;	Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.	Самосвал - 2 , Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на всфалт - 1				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH							3	3	3 3	3 3	3	3	3 3	3 3	3	3	3 3	3														
зоване на ствуващата тонова настилка ючително, лиране на депо				6	Технически ръководител;	Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																																				
і и полагане на ордюри 18/35/50 и свързни с това чазходи	84	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	28	Технически ръководител;	Геодезист, Специалист по конгрол на качеството; Специалист по Здравословни и безопасни : Условия на труд	Товарен автомобил - 1, Самосвал - 1																						3	3	3 3	3	10	3 3	3	3 3	3 3	3	3 4	3	3 3	3 :	
гасил от скален на пластове за основа, вкл. е и уплътняване	16	общ работник - 2; работник пътно строителство - 2	4	4	Технически ръководител;	The second second	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																																				



	Т		ž				5° P	5 ¥			יו		П		-		7	1	77		_	77	7.	,	 _	_	 		_													2.7
Битумен разлив		120	общ работник - 2; работн		3	40	Технически ръководител Специалист по контрол н	жачеството; Специалист по здравословни и безопасни	And an annual of the state of t																																	
Доставка и полагане н неплътен асфалтобето /Биндер/ за изравнител пласт	н	56	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2		3	22	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по	контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на тем	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк	лорационен - 1; виброплоча - 1																																1
Доставка и полагане на асфалтова смес за износв иласт – Лиътен асфалтобе тип"А"	ащ ,	54	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2		3	18	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството:	Специалист по Дравословни и безопасни	Самосвал - 2, кофалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк	вибрационен - 1; Виброплоча - 1																																
Доставка и монтаж на стандартни, рефлектирац пътни знаци, клас-1, П-ри типоразмер; Укрепване стандартни знаци, тръбн стойки ф 60 L = 3.0 м	i :	2	работник пътно строителство - 1		1	2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството;	Специалист по Дравословни и безопасни условие на токи	Автомобил таварен - 1														-																			
Доставка и полагане на эризонтална маркировка бяла боя с перли	от 3		работник пътно строителство - 1		1	3	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството;	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	маркировъчна машина - 1																																	
Подетап 2.7. СМР на "Реконструкция и рехабилитация на ул. Станко Маринцестов																																										
Почистване на уличното платно за строителство, имчително натоварване и превоз на дело; Изкол използваем материал, в к превоз на дело до 3км	15		общ работник - 3	3	2!	Texamination of the contract o	Геодезист, Специалист по контрол на качеството;	специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																		3 3	3 :	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3	
Фрезоване на съществуващата фалтобетонова настилка кочително, транспортиран на депо	e				8	Технически ръководител:	Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист со	дравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																							188	000			898		1000				
Јоставка и полагане на онови бордиори 18/35/50 л. всички свързни с това разходи	87		общ работник · 2; работник пътно строителство · 1	3	29	Технически ръководител;	Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по	идравословни и безопасни условия на труд	Товарен автомобил - 1, Самосвал - 1																																3	
зправа насип от скален этериал на пластове за в основа, вки, разстилане и уплътняване	8	of in passing 2.	оощ работник - 2; работник пътно строителство - 2	4	2	Технически ръководител;	Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по	здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																																200	
Битумен разлив	192	общ работник - 2: работник	тно строител	3	64	Технически ръководител;	Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопатии	условия на труд	Гудронатор - 1																																	
хтавка и полагане на плътен асфалтобетон чдер/ за изравнителен пласт	111		пътно стр	3	37	Технически ръководител;		и безопасни условия на труд	Асфалтополага - 1, Валяк Статичен - 1, Валяк Вибрационен - 1; Вибполича - 1																																	
ставка и полагане на пова смес за износващ – Плътен асфалтобетон тип"А"	93	общ работник - 1; работник	пътно строителство - 2	3	31	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по	контрол на качеството; Специалист по	условия на труд	Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1	П																															+	ē.
ставка и монтаж на дартии, рефлектиращи и знаци, клас-1, II-ри завмер, Укрепване на цартии знаци, тръбни Эйки ф 60 L = 3.0 м	3	работник пътно		1	3	Гехнически ръководител; Геодезист; Специалист по	контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд	Автомобил товарен - 1																																	
тэвка и полагане на нтална мархировка от ідла боя с перли	3	работник пътно	CTPONTEACTBO - 1	1 1	3	технически ръководител; Геодезист; Специалист по	контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд	маркировъчна машина - 1																																	

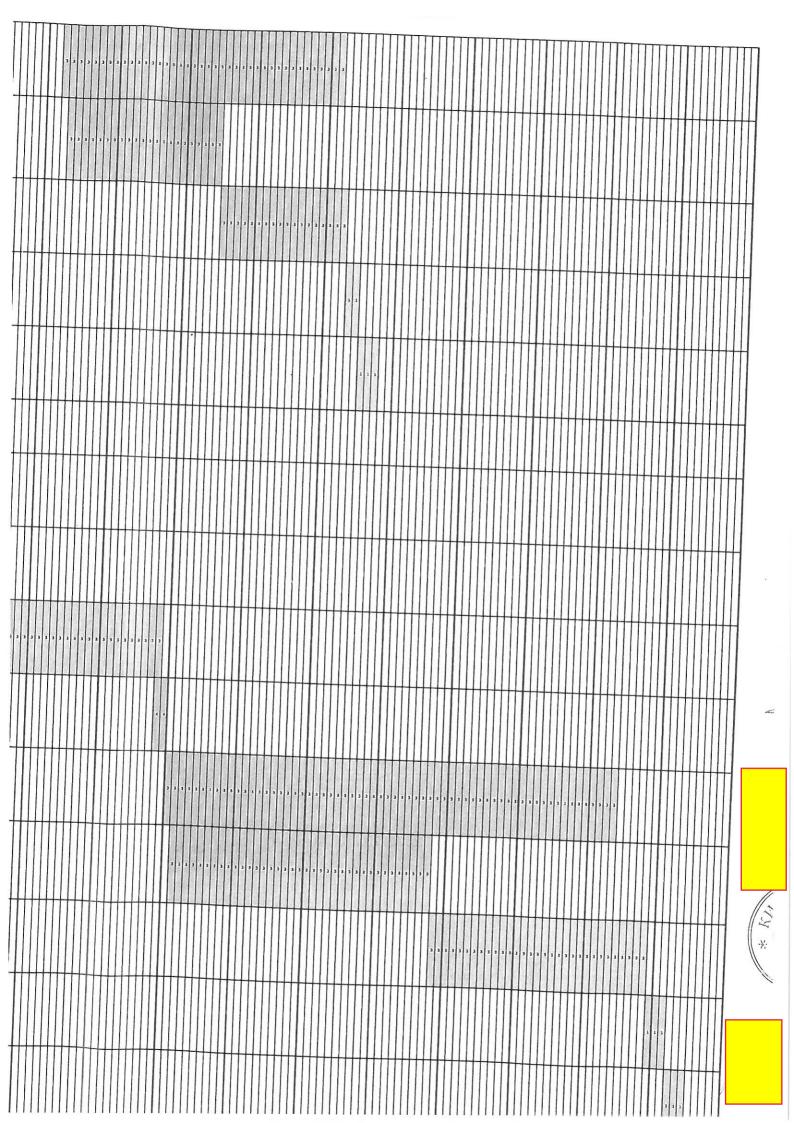



ейност 1 - Почистване на проителната площадиа; ремахване на временно строителство; Демобилизация	15	общ рабатник - 3	3	5	Технически рыководител; Специалист по эдравострони и безопасии Условия на труд Товарен автомобил - 2																																												
ійност 2 - Подписване на т обр 15 за установяване здността за приемане на строежа				1	Технически ръководител																																												
Обща трудоемкост (човекодни)	1851		•			4	4 4	4 4	6	6 6	6 6	6 6	6	,	,	, ,	9 9	12 1	15 2	5 15 1	5 15	15 15	15 7	5 25	15 13	13 12	12 3	2 12	12 12	13 1	3 13	16 15	15	16 16	16 2	16 16	16 1	6 16	15 1	8 18	18 1	8 14	15 1	5 18	15 1	13 12	3 13	13	10





Диаграма на работната ръка за за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица "Гео Милев", улица "Георги Бондоков", улица "Гоце Делчев", улица "Станко Маринцестов", улица "Лев Толстой", ул. "Димитър Зограф", улица "Борис Попарданов", улица "Иван Вазов", улица "Климент Охридски" улица "Христо Смирненски", улица "7-ми Ноември" и улица "Дунав"

За Обособена позиция № 1: "Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. "Станко Маринцестов", ул. "Лев Толстой", ул. "Борис Попарданов", ул. "Иван Вазов", ул. "Климент Охридски", ул. "Христо Смирненски", ул. "7-ми ноември"

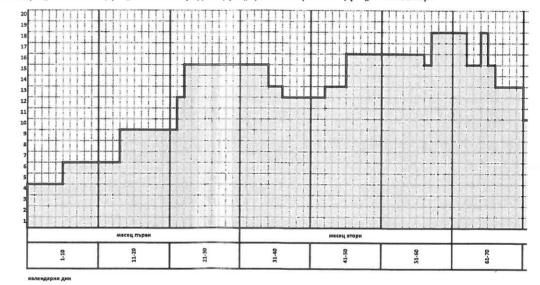





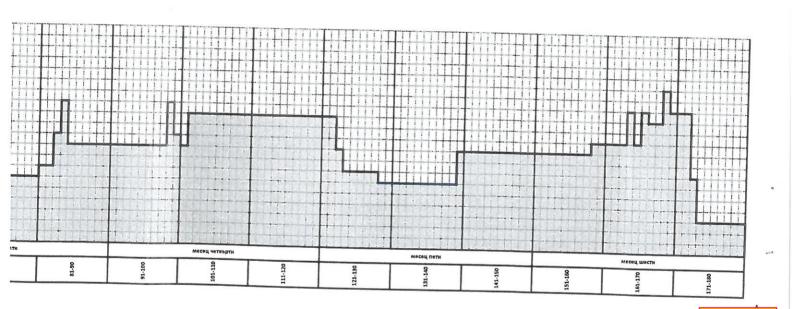

Заличаване на основание чл.2 от ЗЗЛД
