
Линеен календарен график за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – у. 'еорги Бондоков", улица "Гоце Делчев", улица "Станко Маринцестов", улица "Лев Толстой", ул. "Димитър Зограф", улица "Борис Попарданов", улица "Иван Вазов", улица "Христо Смирненски", улица "7-ми Ноември" и улица "Дунав"

Обособена позиция № 2: "Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. "Дунав", ул. "Георги Бондоков", ул. "Гео Милев", ул. "Димит Делчев""

Етапи и поетапи на изпълнение, видове	(ост за дейност дни)	брой	i	ни дни	тговорни гението	цима техника								мес	ецп	ърви		_									-				Mece	цвт	орн								T			_		
дейности и СМР	трудоемкост за съответната дейност (човеко дни)	ло специал ности	Т	календарни дни	експерти, отговорни за изпълнението	необходима строителна техника	F		1:10			T			11-20			T			21-30					31-40	_		T			41-50			T	_		51-60	_	_	\dagger		61-70		_	Τ
Етап 1 - подготвителен			T	T										T					П		Π			Π			I	T									П	\prod	Ţ	П	t	Π			Π	T
ност 1- Подписване на окол обр. 2а за откриване гроителна площадка				1	Технически ръководител																																									I
ност 2- Организация на ителната площадка; кенно строителство; илизация на строителна энизация	15	общ работник - 3	3	5	Технически ръководител; Специалист по здравословни и безопасни условия на Труд	Товарен автомобил - 2	3 3	3	3 3																																					
тап 2 - Основен ап - изпълнение на СМР					•																																									I
юдетал 2.1. СМР на "Реконструкция и рекабилитация на ул. "Дунав"																																														
Почистване на уличното матно за строителство, почително натоварване и превоз на депо; изкоп плолаваем материал, вкл. превоз на депо до Зкм	18	общ работник - 3	3	6	Технически ръководител; Геодезист; Спецналист со нострол на качестоото; Спецналист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Челен товарач- 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1				3	3 3	3 1																																		
Фрезоване на съществуващата фалтобетонова настилко кжително, тражспортиране на депо				6	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по компрол на кечеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза- 1, Машина за издукване на асфалт - 1																																								
Доставка и полагане на гонови бордюри 18/35/50 ил. всички свързни с това разходи	6	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни Условия на труд	Товарен автомобил - 1, Самосвал - 1							75.					-																												
Битумен разлив	75	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	25	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Гудронатор - 1								3	3 3	3 1	3	3 3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3 3	5	. 3	3.						100000000000000000000000000000000000000												
Доставка и полагане на нелиътен асфалтобетон зиндер/ за каравнителен пласт	42	общ работник - 1; работник Пътно строителство - 2	3	14	Техически рыководител; Геодезист; Специалист по Контрол на качеството; Специалист по ддравословни и безопаски условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1									3 3	3 3	2	3 3	3 3	3 3	3 3	3																								
Доставка и полагане на фалтова смес за измосващ уст – Плътен эофалтобетон тип"А"	36	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	12	Технически рыкаводител; Геодемст, Специалист по монгрол на качеството; Специалист по Хдравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 3, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																1	3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3																	The state of the s
Доставна и монтаж на андартии, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри «поразмер; Укрепване на гандартии знаци, тъъбии стойки ф 60 L = 3.0 м	2	работник пътно строителство - 1	1	2	Технически ръководитъл; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Автомобил товарен - 1																							1	1																
Доставка и полагане на зизонтална маркировка от бяла боя с перли	2	работник пътно строителство - 1	1	2	Технически ръководител; годевист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и без опасни условия на труд	маркировъчна машина - 1																								1	and the second second															

_						T					_	_		ME	сец	чет	ърт				_			_						_									_	_			_		Г																			1			
T			81-90		_	1			91-100			7			_	101-110		_	T		_	111-120			-				90	_		Т	_	Mec		ети		7			0											М	есец		ести												
T					П	1	П	П	16		T	1	T	П	T	ā 	Τ	П	+	П	П	E	Π	T	1	T	П	T	121-130	Т	T	-	Т	П	131-140	1	П	1	П	-	141-150	П	_	1	_		1	DQT-TCT					161.170	161-170			T			171-180	001-110						
		1			1	1	+	1	1	1	+	1	+	1	1	1	1	+	-	+	+	+	+	-	1	+	+	+	+	1	+	-	-	+	-	+	4	1	-	\parallel	-	1	+	4	1		H	1															\prod				
#	+	+	H	+	+	+	+	1	H	4		+	-	1	1	+	\parallel	+		-	1	-		1			1		1		1																																				
\prod														1									1					1		1	1	1	+	1	1	1	1	+	1	+	\parallel	+	#	+	+	+	+	+	-	1	+	+	+	11	+	+	4	-	4	-	4	1	1				
																	+			+			-	1		1					1					-																$\ $															
							T					1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	$\ $	+	+	-	+	1	+	+	1	+	+	+	-	-	H	1	+	H	+	-	1	+	H	+	-	$\ $	-	1	\parallel	-	\prod	1	4	4	\prod	4	\prod	4					
																																																														H					
																																																																8			
																																																															- // X X X		I	1.	


етап 2.2. СМР на еконструкция и билитация на ул. амитър Зограф			I										1 1000																							
чстване на уличното но за строителство, ително натоварване и воз на депо; Изкоп лізваем материал, вкл. воз на депо до Зкм	36	общ работник - 3	3	12	Технически Геодезист; контрол н Специалист по безопасни у	Самосеал - 2 , Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																	3 3	3 1	3 3	3 3	3 :	3 3	3 3							
зава насил от скален м на пластове за пътна за, вкл. разстилане и уплътняване	36	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	12	Технически ръководител; Специалист по контрол на начеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброллоча - 1																													3 3	rs.
тавка и полагане на зви бордюри 18/35/50 юнки свързни с това разходи	24	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	8	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопатни условии на	труд. Товарен автомобил - 1 , Самосвал - 1																								3 3	3 3	3 3	3 3	3		
Битумен разлив	27	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	9	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Гудронатор - 1																														
тавка и полагане на пова смес за основен Асфалтобетон тип "АО"	15	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	5	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на мачеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополатач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк зибрациснен - 1; Вибреплоча - 1																														
тавка и полагане на гова смес за износващ - Плътен асфалтобетон тип"А"	12	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	4	Технически ръководитвл; Геодезист; Специялист по контрол на качеството; пециалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк стятичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча -																														
ставка и монтаж на артни, рефлектиращи и знаци, илас-1, II-ри зазмер; Укреповне на дартни знаци, тръбни эйки ф 60 L = 3,0 м	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; пециалист по пециалист по здравословні безопасни условия на труд	Автомобил товарен - 1																														
тавка и полагане на нтална маркировка от 5яла боя с перли	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически рыховодител; Геодезит; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни С и безопасни условия на труд и	маркировъчна машина - 1																														
етап 2.3. СМР на еконструкция и юплитация на ул. юрги Бондоков																																				
истване на уличното тно за строителство, изтелно натоварване и звоз на дело; Изкоп изваем натериал, вил. звоз на дело до Зким	81	общ работник - 3	3	27	Технически ръководител; Геодевист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по ддравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Чолен товарач- 1, Багер - 1, Мяшина за издухване на асфалт - 1											3.3	3	3 2	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 1	3	3 3	3 3	3	3 3	3 :	3				
ане на съществуващата тгобетонова настилка пелно, транспортиране на депо				3	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; "пециалист по здравословну 1 безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																														
тавка и полагане на зъи бордюри 18/35/50 эсички сеързни с това разходи	42	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	14	Техимчески ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Лециалист по здравословни безопасни условия на труд	Товарен автомобил - 1, Самосвал - 1																											3 3	3 3	3	3 3
зава насил от скален ал на пластове за пътна ва, вкл. разстилане и упиътняване	56	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	22	Техинчески рыководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по ддравословни (и безопасни условия на труд в	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																														

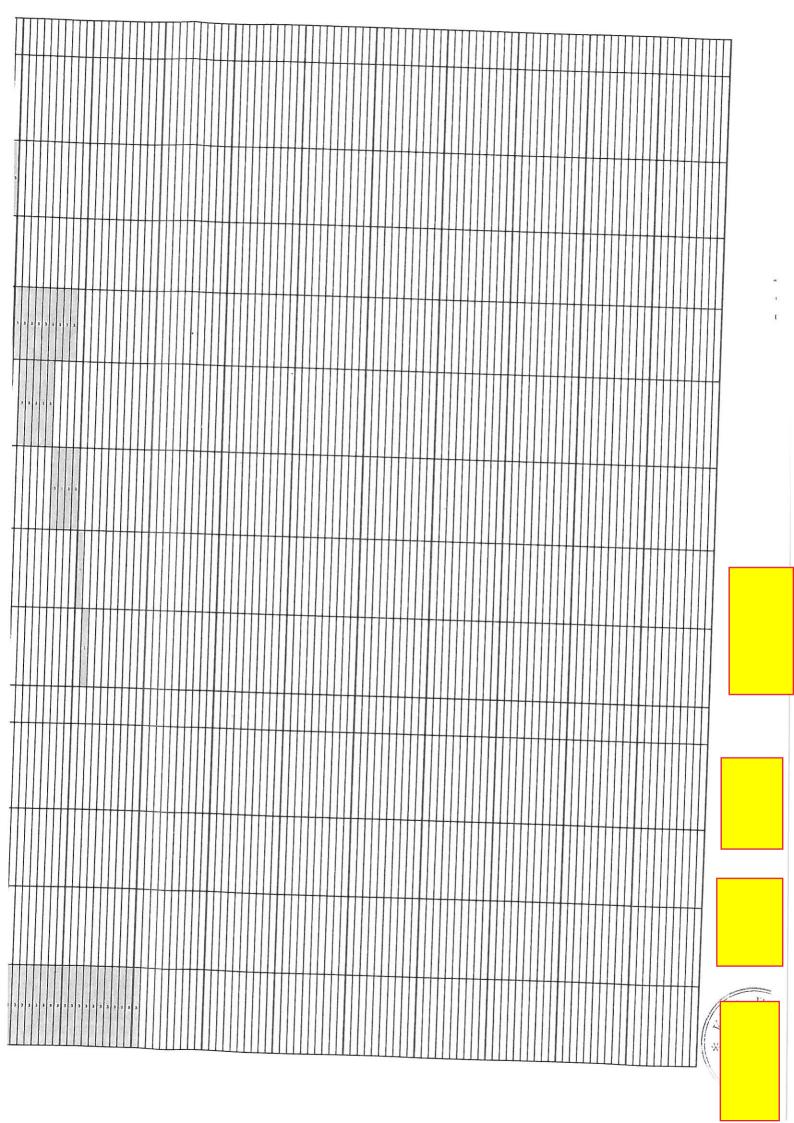

оставка и полагане на Бе 820	тон	3	общ работник - 2; бетонджия - 1		3	Текнически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни	условия на труд Бенотовоз - 1														3									
Доставка и полагане на Бетонови тръби ф500 /армирани/, вкл. хидроизолация	9	,	общ работник - 1; каналджия - 1; изолаторджия -1	3		жоводител; щиалист по эчеството; дравословни	л сезопасти уславил на труд Автомонил товарен - 1, Автокран - 1														3	3 3								
Битумен разлив	56	5	общ работник - 2; работник пътно строителство - 2	3	22	ководител; контрол на ециалист по и безопасни	Гудронатор - 1																							
Доставка и полагане на сфалтова смес за основен вст – Асфалтобетон тип "А		, many	оощ работник - 1, работник пътно строителство - 2	3	10	•Технически Геодезист; (контрол н пециалист по безопасни у		-																						
Доставка и полагане на неплътен асфантобетон Биндер/ за изравнителен пласт	9	ofin pafernum 1. pages	пътно строителство - 2	3	3	ководител; циалист по неството; равословни на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча -																							
Доставка и полагане на фантова смес за износващ вст – Плътен асфалтобетон тил [*] А [*]		общ работник - 1: работник	пътно строителство - 2	3	10	Технически ръководител; Геодевист; Специалист по контрол на жачествотос "Специалист по здаввословни и безопасни условия на труди	Замосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк ибрационен - 1; Виброплоча -																							
Доставка и монтаж на андартни, рефлектираци пяти знаци, клас-1, II-ри члорамеру Укрепавне на гандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м	1	работник пътно	строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословии и безопасни условия на труд	Автомобил товарен - 1																							
Доставка и полагане на изонтална маркировка от била боя с перли	2	работник пътно	строителство - 1	1	2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по конгрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	1 -																							-
Іодетал 2.4. СМР на "Реконструкция и ехабилитация на ул. "Гео Милев"																								1				\dagger	\parallel	-
Іочистване на уличното матно за строителство, почително натоварване и превоз на дело; Изкол зползваем материал, вкл. превоз на дело до 3км.	12	общ работник - 3		3	4	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	:амосвал - 2 , Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на всфалт - 1				The state of the s																			•
іоване на съществуващата фалтобетонова настилка эчително, транспортиране на депо					3	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни Условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за издукване на асфалт - 1																							
аправа насип от скален риал на пластовое за пътна нова, вкл. разстилане и упиътняване	6	общ работник - 2; работник	T-one ciposiciones	3	2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на начеството; Специалист по здравословни и безопе: ни условия на труд	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																							
Битумен разлив	21	общ работник - 2; работник пътно		3	7	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд	Гудронатор - 1																							
оставка и полагане на яплътен асфалтобетон ічдер/ за каравинтелен пласт	9	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2		3	3	Гехнически рыководитил; Геоделинст Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валяк Статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																							


	+												200			3021				100			200		100																												
												3	3	3	3	3	3 2	3	3	3 3	3	3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3 3	3	3	3 3	3																									
													31	3 3	5	3 3	3	3	3																																		•
																				3	3	3																															
																						3	3	3	3 3	3	3	3 3	3																								
																												The same of the sa		Marchane in the manufacture																							
																														3.00 or																							
+		1					1				+								+							-			1000	0350	1000	100	+				-				1					1		1		1		1	
																													Э		3	3 (2010)																					
																																3	3																				
																																		3 3	3	STATE OF STA	3 3	3															
																																		3	CENTRAL PROPERTY OF COMMUNICATION	S STATE OF S																	

Доставка и полатане на фалтова смес за износващ ласт – Плътен асфалтобетон тип"А"	12	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	4	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безоласни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополатач - 1, Валяк статичен - 1, Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																				
Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи тътни знащи, маст-2, II-ри типоразмер; Укрепване на стандартни знащи, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодеэнст; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условня на труд	Автомобил товарен - 1																				Section of the sectio
Доставка и полагане на оризонтална маркировка от бяла боя с перли	1	работник пътно строителство - 1	1	1	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качествого; Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд	маркировъчна машина - 1																				
Подетап 2.5. СМР на "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Гоце Делчев"																										
Почистване на уличното платно за строителство, миючително на чатовареане превоз на дело; Изкоп екзползваем материал, вил. превоз на дело до 3км	21	е - мингоред тдо	3	7	Технически ръковдаятел; Геодевист, Специалист по ионтрол на качеството; Специалист по ддравосновни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Челен товарач - 1, Багер - 1, Машина за издухване на асфалт - 1																				
резоване на съществуващата асфалтобетонова настилка иючително, транспортиране на депо				2	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на квчеството; Специалист по здравословни к безопасни условия на труд	Самосвал - 2 , Пътна фреза - 1, Машина за мадукване на асфалт - 1																				
Доставка и полагане на етонови бордори 18/35/50 вил. всички съързни с това разходи	57	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	19	Техимески ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; пециалист по здравословни ј безопасни условия на труд	Товарен автомобил - 1 , Самосвал - 1																				
Направа насип от скален ятермал на гластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	39 .	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	13	Технически ръководител; Геодезист, Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословии и безопаски условия на трук	Самосвал - 2, Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1																				
Битумен разлив	54	общ работник - 2; работник пътно строителство - 1	3	18	Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Гудронатор - 1																				
Доставка и полагане на асфалтова смес за основен наст — Асфалтобетон тип "АО"	24	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	8	Технически ръководител; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравостовни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополатач - 1; Валяк статичен - 1; Валяк вибрационен - 1; Виброплоча																				
Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	9	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	3	3	ежнически ръководител; содезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по дравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1, Валяк статичен - 1, Валяк вибрационен - 1; Виброплоча - 1							Constitution of the second sec													
Доставка и полагане на кфалтова смес за износващ ласт – Плътен афалтобетон тип"А".	21	общ работник - 1; работник пътно строителство - 2	э	7	ежинчески ръководител; Геодезист Специаликт по контрол на качеството; Специалист по Адравословни и безопасни условия на труд	Самосвал - 2, Асфалтополагач - 1; Валак статичен - 1; Валак вибрационен - 1; Виброплоча - 1																				
Доставка и монтаж на стандартии, рефлектиращи пъти внащи, клас-1, П-ри типоразмер; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 l = 3.0 м	2	работник пътно строителство - 1	2	1	Технически ръководител; Геодевист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравослов ни и безопасни условия на труд	Автомобил товарен - 1																				
Доствька и полагане на оризонтална маркировка от бяла боя с перли	2	работник пътно строителство - 1	2	1	Технически ръководител; Геодевит; Специалист по контрол не жачеството; Специалист по здравословни и безопасни з условим на труд	маркировъчна машина - 1																				

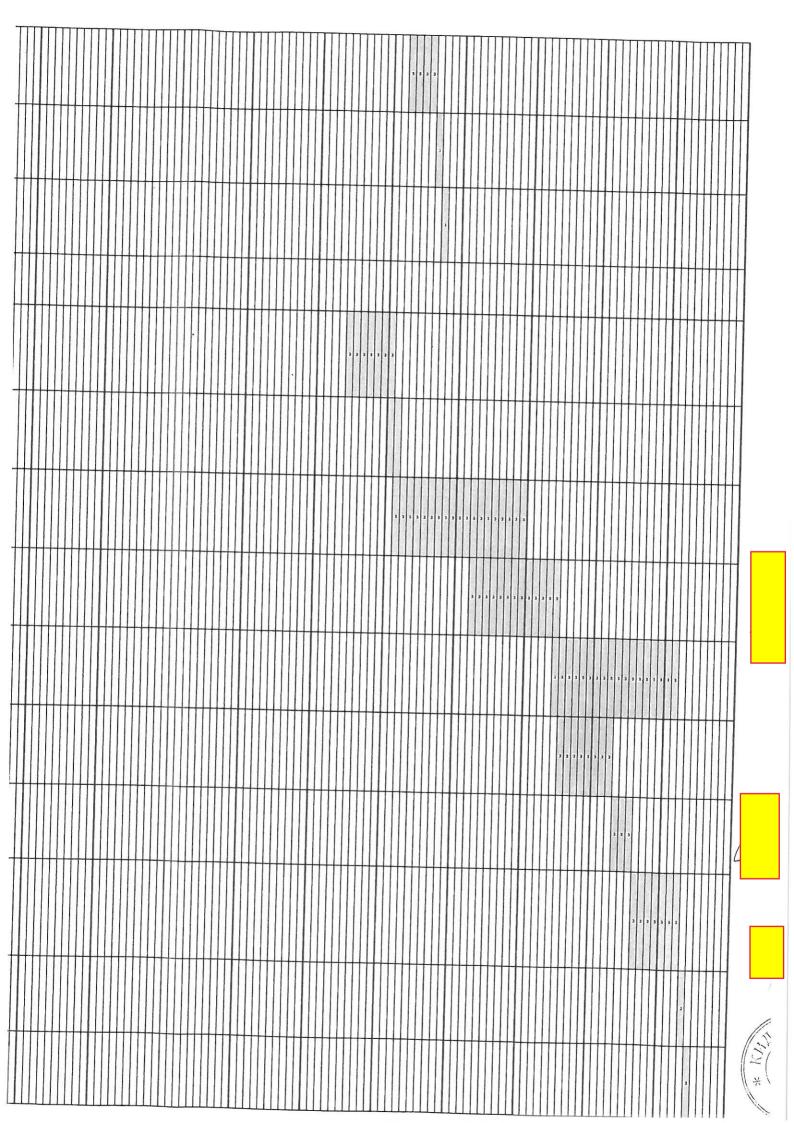


<u>Етап 3 -</u> <u>заключителен</u>																																		T							I	T
lейност 1 - Почистване на строителнята площадка; Премахване на временно юнтелство; Демобилизация	10	общ работник - 2	2	5	Текнически ръководител; адражинт по довежени в труд условие на труд Товарен автомобил - 2																																					
ейност 2 - Подписване на ст обр. 15 за установяване одността за приемане на строежа				1	Технически ръководител																1				1																	
Обща трудоемкост (човекодни)	988		5000			3	3 2	3	,	3 3	, ,	, ,	,	3 6	6 6	6 6	1					1.		1	Ţ		1	1		1	1	1		1	†	H	1	1	+	t	t	6

Дата: 22.05.2018г.




Диаграма на работната ръка за за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица "Гео Милев", улица "Георги Бондоков", улица "Гоце Делчев", улица "Станко Маринцестов", улица "Лев Толстой", ул. "Димитър Зограф", улица "Борис Попарданов", улица "Иван Вазов", улица "Климент Охридски" улица "Христо Смирненски", улица "7-ми Ноември" и улица "Дунав"

Обособена позиция № 2: "Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. "Дунав", ул. "Георги Бондоков", ул. "Гео Милев", ул. "Димитър Зограф", ул. "Гоце Делчев""



1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	21.60	07-19
	месец първи			месец втори		
	-	6253305535				
+++++					. sb.	re re sersien
4:::14						
thiitit			ttttiiit		t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
		HHHHHHH			1111111111	
		++++++++				



Weccel delay weccel usin weccel using the weccel using weccel using weccel using weccel using weccel usin weccel using weccel

Заличаване на основание чл.2 от 33ЛД
